


PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - AUTONOME PROVINZ BOZEN  
 Rettifica SS 508 Val Sarentino - 4° Stralcio / Ausbau der SS 508 Sarntal - 4. Auszug  
 PROGRAMMA DEI LAVORI - ARBEITSPROGRAMM

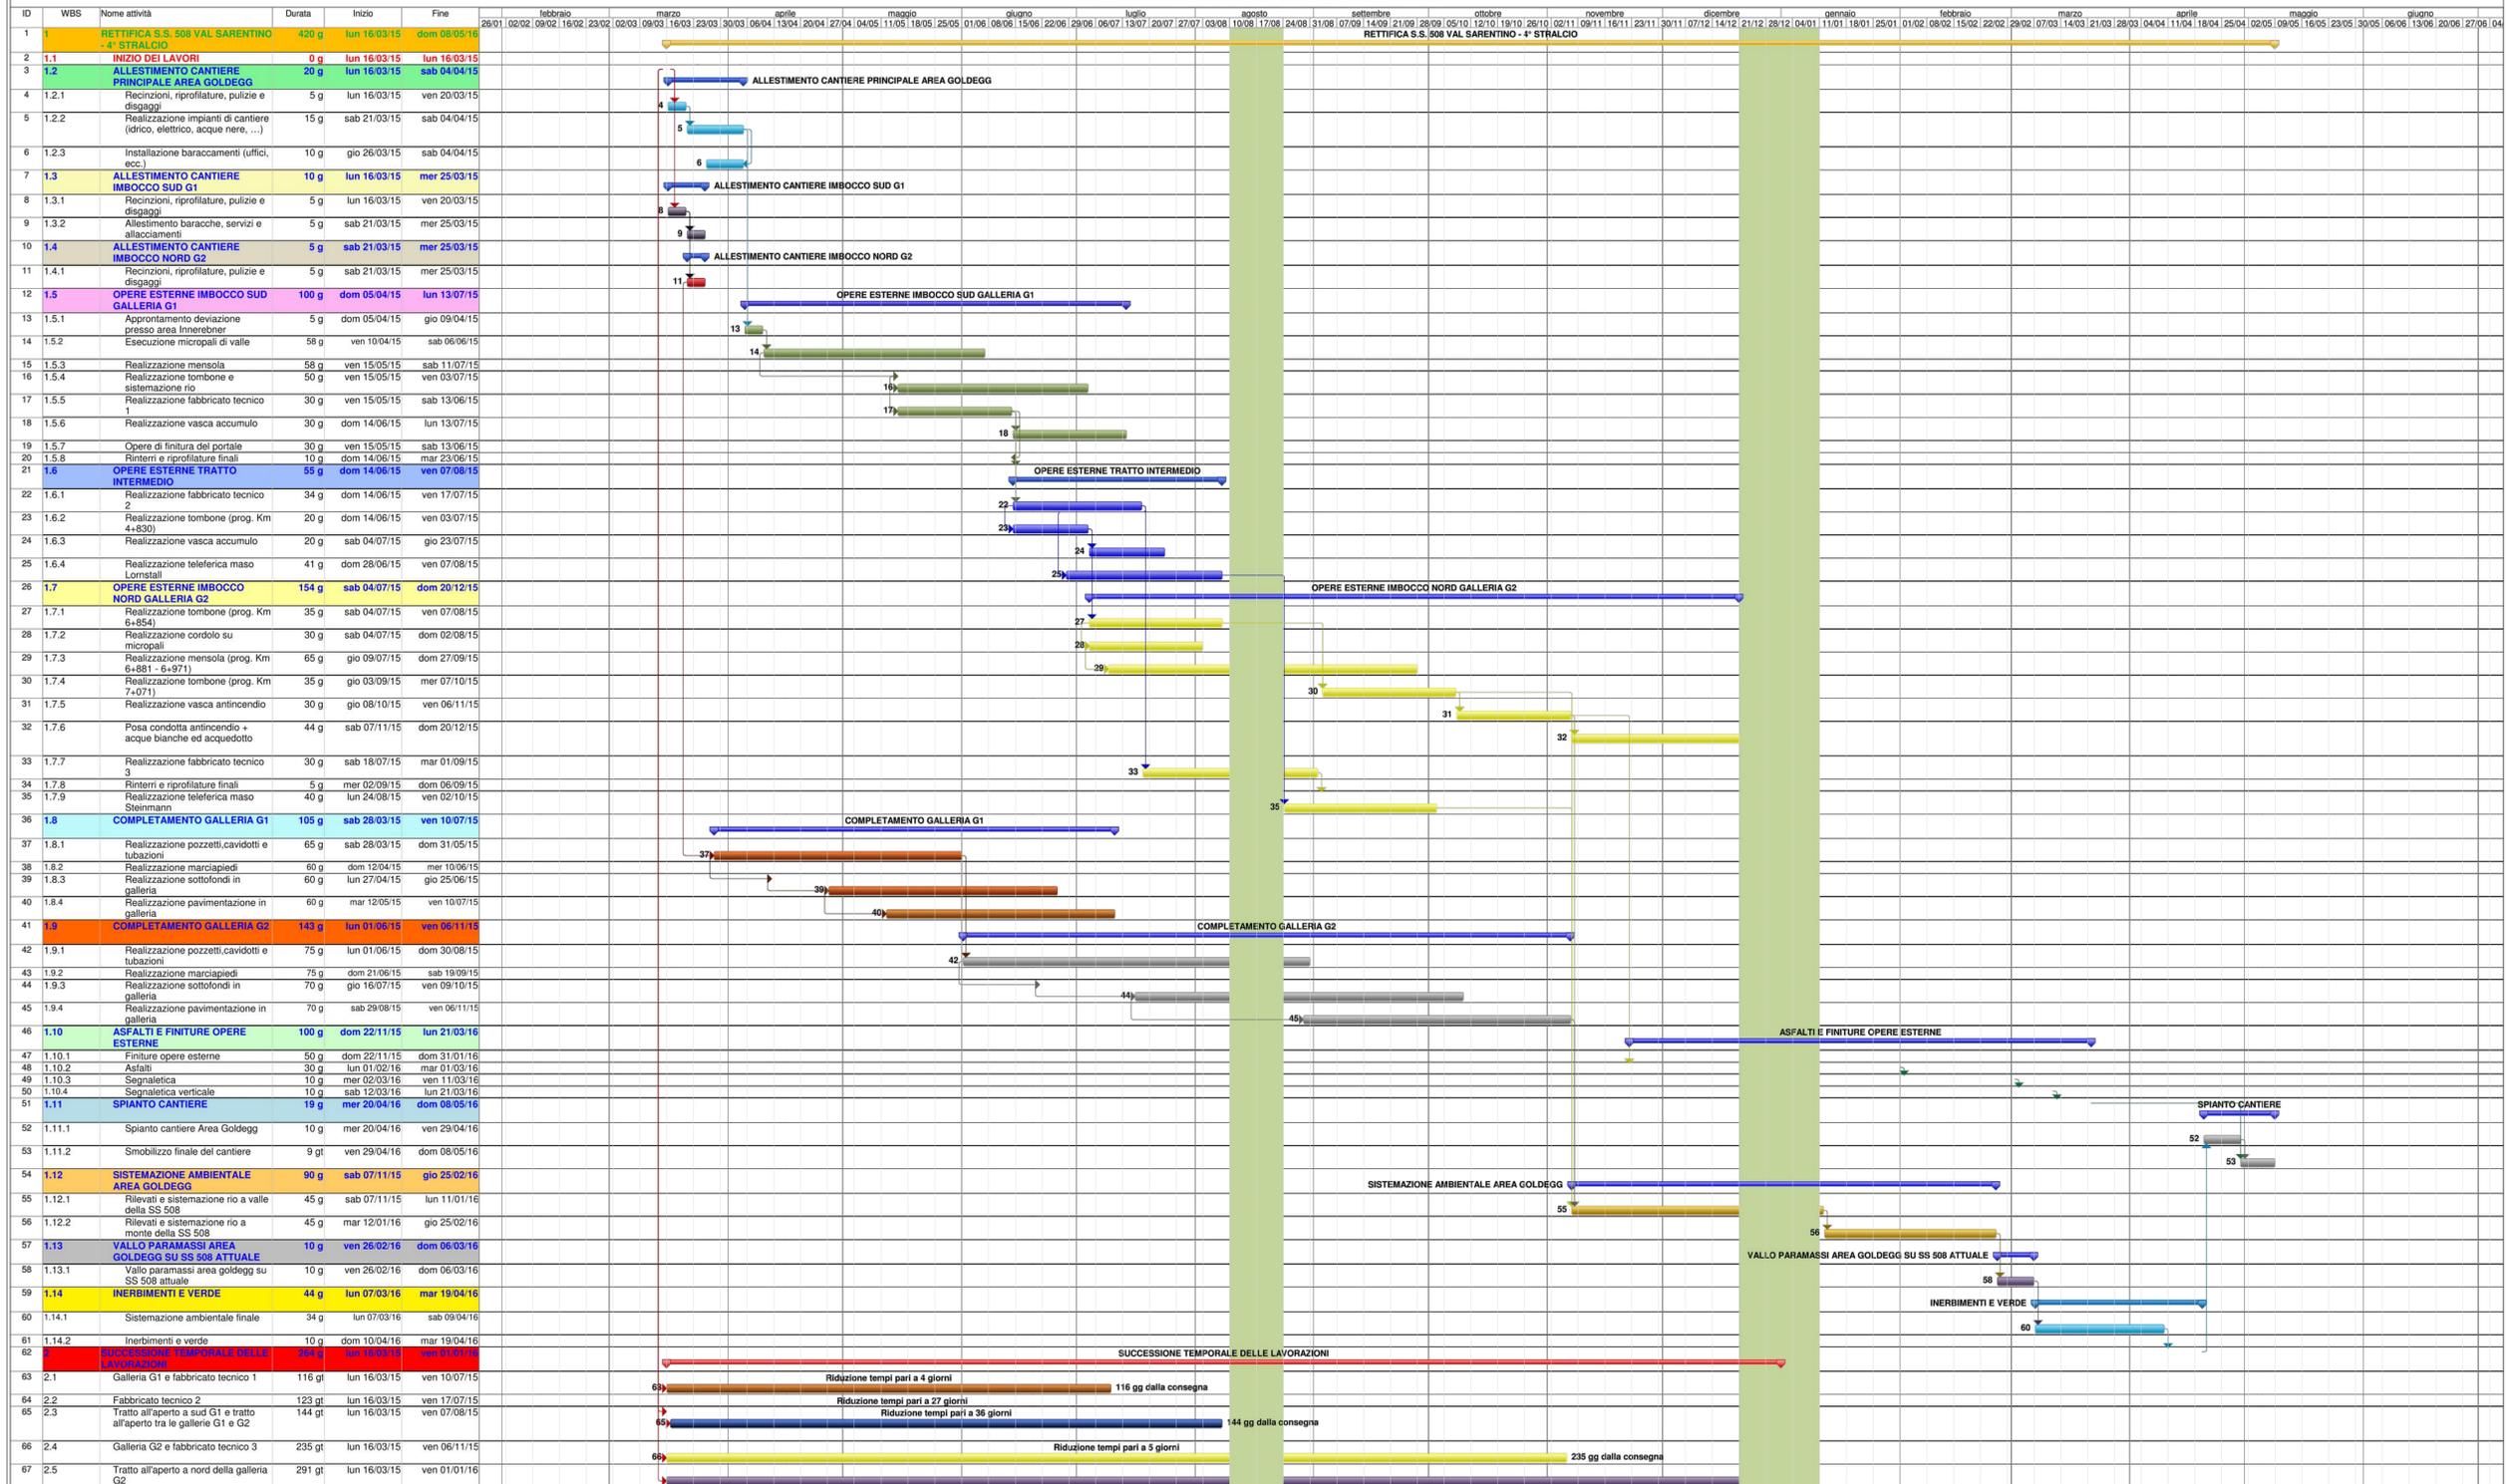

ID	WBS	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	1	RETTIFICA S.S. 508 VAL SARENTINO - 4° STRALCIO	420 g	16/03/15	08/05/16
2	1.1	INIZIO DEI LAVORI	0 g	16/03/15	16/03/15
3	1.2	ALLESTIMENTO CANTIERE PRINCIPALE AREA GOLDEGG	20 g	16/03/15	04/04/15
4	1.2.1	Recinzioni, riprofilature, pulizie e disaggi	5 g	16/03/15	20/03/15
5	1.2.2	Realizzazione impianti di cantiere (drico, elettrico, acque nere, ...)	15 g	21/03/15	04/04/15
6	1.2.3	Installazione baraccamenti (uffici, ecc.)	10 g	26/03/15	04/04/15
7	1.3	ALLESTIMENTO CANTIERE IMBOCCO SUD G1	10 g	16/03/15	25/03/15
8	1.3.1	Recinzioni, riprofilature, pulizie e disaggi	5 g	16/03/15	20/03/15
9	1.3.2	Allestimento baracche, servizi e allacciamenti	5 g	21/03/15	25/03/15
10	1.4	ALLESTIMENTO CANTIERE IMBOCCO NORD G2	5 g	21/03/15	25/03/15
11	1.4.1	Recinzioni, riprofilature, pulizie e disaggi	5 g	21/03/15	25/03/15
12	1.5	OPERE ESTERNE IMBOCCO SUD GALLERIA G1	100 g	05/04/15	13/07/15
13	1.5.1	Approntamento deviazione presso area Kneinebner	5 g	05/04/15	09/04/15
14	1.5.2	Esecuzione micropali di valle	58 g	10/04/15	06/06/15
15	1.5.3	Realizzazione mensola	58 g	15/05/15	11/07/15
16	1.5.4	Realizzazione tombone e sistemazione rio	50 g	15/05/15	03/07/15
17	1.5.5	Realizzazione fabbricato tecnico 1	30 g	15/05/15	13/06/15
18	1.5.6	Realizzazione vasca accumulo	30 g	14/06/15	13/07/15
19	1.5.7	Opere di finitura del portale	30 g	15/05/15	13/06/15
20	1.5.8	Rintieri e riprofilature finali	10 g	14/06/15	23/06/15
21	1.6	OPERE ESTERNE TRATTO INTERMEDIO	55 g	14/06/15	07/08/15
22	1.6.1	Realizzazione fabbricato tecnico 2	34 g	14/06/15	17/07/15
23	1.6.2	Realizzazione tombone (prog. Km 4+830)	20 g	14/06/15	03/07/15
24	1.6.3	Realizzazione vasca accumulo	20 g	04/07/15	23/07/15
25	1.6.4	Realizzazione teleferica maso Lornstall	41 g	28/06/15	07/08/15
26	1.7	OPERE ESTERNE IMBOCCO NORD GALLERIA G2	154 g	04/07/15	20/12/15
27	1.7.1	Realizzazione tombone (prog. Km 6+854)	35 g	04/07/15	07/08/15
28	1.7.2	Realizzazione cordolo su micropali	30 g	04/07/15	02/08/15
29	1.7.3	Realizzazione mensola (prog. Km 6+881 - 6+971)	65 g	09/07/15	27/09/15
30	1.7.4	Realizzazione tombone (prog. Km 7+071)	35 g	03/08/15	07/10/15
31	1.7.5	Realizzazione vasca antincendio	30 g	08/10/15	06/11/15
32	1.7.6	Posa condotta antincendio + acque bianche ed acquedotto	44 g	07/11/15	20/12/15
33	1.7.7	Realizzazione fabbricato tecnico 3	30 g	18/07/15	01/09/15
34	1.7.8	Rintieri e riprofilature finali	5 g	02/09/15	06/09/15
35	1.7.9	Realizzazione teleferica maso Steinmann	40 g	24/08/15	02/10/15
36	1.8	COMPLETAMENTO GALLERIA G1	105 g	28/03/15	10/07/15
37	1.8.1	Realizzazione pozzetti, cavidotti e tubazioni	65 g	28/03/15	31/05/15
38	1.8.2	Realizzazione marciapiedi	60 g	12/04/15	10/06/15
39	1.8.3	Realizzazione sottofondi in galleria	60 g	27/04/15	25/06/15
40	1.8.4	Realizzazione pavimentazione in galleria	60 g	12/05/15	10/07/15
41	1.9	COMPLETAMENTO GALLERIA G2	143 g	01/06/15	06/11/15
42	1.9.1	Realizzazione pozzetti, cavidotti e tubazioni	75 g	01/06/15	30/08/15
43	1.9.2	Realizzazione marciapiedi	75 g	21/06/15	19/09/15
44	1.9.3	Realizzazione sottofondi in galleria	70 g	16/07/15	09/10/15
45	1.9.4	Realizzazione pavimentazione in galleria	70 g	29/08/15	06/11/15
46	1.10	ASFALTI E FINITURE OPERE ESTERNE	100 g	22/11/15	21/03/16
47	1.10.1	Finiture opere esterne	50 g	22/11/15	31/01/16
48	1.10.2	Asfalti	30 g	01/02/16	01/03/16
49	1.10.3	Segnaletica	10 g	02/03/16	11/03/16
50	1.10.4	Segnaletica verticale	10 g	12/03/16	21/03/16
51	1.11	SPIANTO CANTIERE	19 g	20/04/16	08/05/16
52	1.11.1	Spianto cantiere Area Goldegg	10 g	20/04/16	29/04/16
53	1.11.2	Smobilitazione finale del cantiere	9 g	29/04/16	08/05/16
54	1.12	SISTEMAZIONE AMBIENTALE AREA GOLDEGG	90 g	07/11/15	25/02/16
55	1.12.1	Rilevati e sistemazione rio a valle della SS 508	45 g	07/11/15	11/01/16
56	1.12.2	Rilevati e sistemazione rio a monte della SS 508	45 g	12/01/16	25/02/16
57	1.13	VALLO PARAMASSI AREA GOLDEGG SU SS 508 ATTUALE	10 g	26/02/16	06/03/16
58	1.13.1	Vallo paramassi area goldegg su SS 508 attuale	10 g	26/02/16	06/03/16
59	1.14	INERBIMENTI E VERDE	44 g	07/03/16	19/04/16
60	1.14.1	Sistemazione ambientale finale	34 g	07/03/16	09/04/16
61	1.14.2	Inerbimenti e verde	10 g	10/04/16	19/04/16
62	1.14.3	SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI	144 g	16/03/15	11/01/16
63	2.1	Galleria G1 e fabbricato tecnico 1	116 g	16/03/15	10/07/15
64	2.2	Fabbricato tecnico 2	123 g	16/03/15	17/07/15
65	2.3	Tratto all'aperto a sud G1 e tratto all'aperto tra le gallerie G1 e G2	144 g	16/03/15	07/08/15
66	2.4	Galleria G2 e fabbricato tecnico 3	235 g	16/03/15	06/11/15
67	2.5	Tratto all'aperto a nord della galleria G2	291 g	16/03/15	01/01/16

AUTONOME PROVINZ BOZEN      PROVINZIA AUTONOMA DI BOLZANO  
 AMT 10.2 - AMT FÜR STRASSENBAU MITTE/SÜD      UFF. 10.2 - UFFICIO TECNICO STRADE CENTRO/SUD

GEGENSTAND:  
**AUSBAU DER S.S. 508 SARNTAL**  
 4. AUSZUG  
 Km 3+000 - Km 7+800  
 OGGETTO:  
**RETTIFICA DELLA S.S. 508 DELLA VAL SARENTINO**  
 4° STRALCIO  
 Km 3+000 - Km 7+800

**AUSFÜHRUNGSPROJEKT**  
**PROGETTO COSTRUTTIVO**

CONTENUTO:	ALLEGATO N°:
<b>PROGRAMMA LAVORI</b>	<b>001</b>
	SCALA:
	-
	DATA:
	10/03/2015

L'IMPRESA

REV.	DATA	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	elaborato	esaminato	approvato
