Piano di Sicurezza e Coordinamento
Kaserne Battisti
Merano | Meran

Dott. Ing. iun.Enzo Todaro
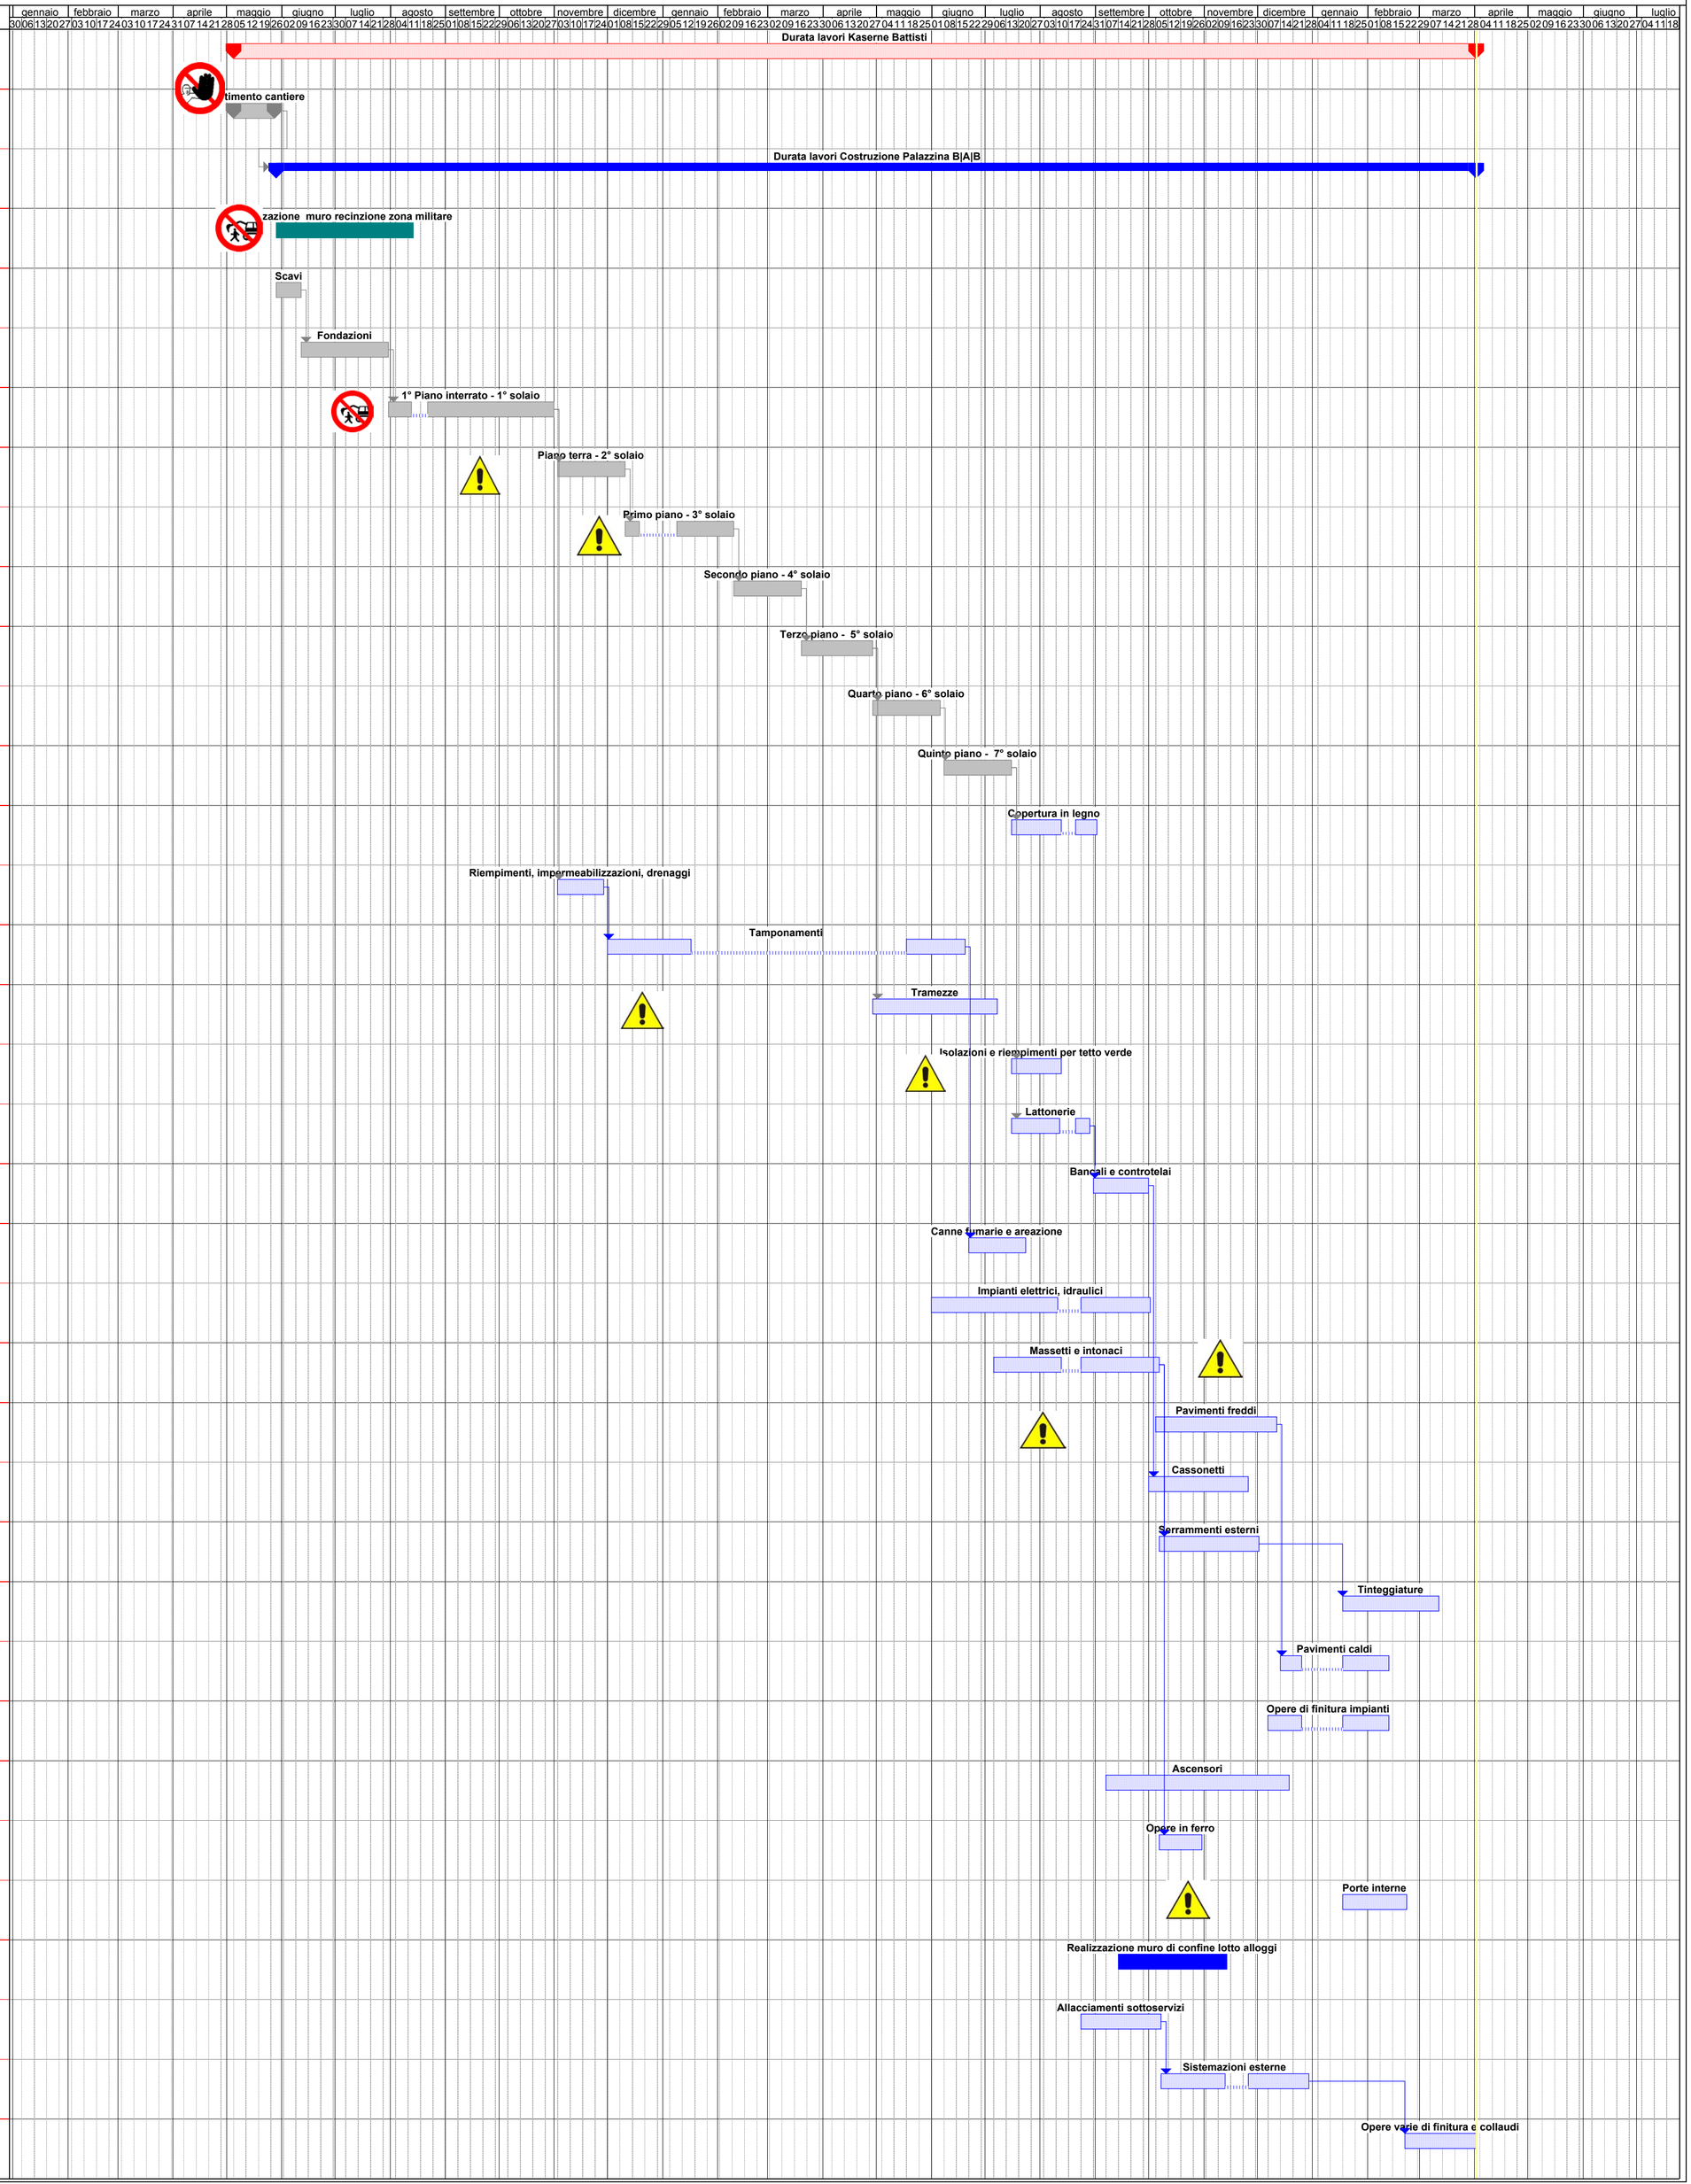
ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	**Durata lavori Kaserne Battisti**	**500 g**	**lun 05/05/14**	**ven 01/04/16**
2	Allestimento cantiere	17 g	lun 05/05/14	mar 27/05/14
3	**Durata lavori Costruzione Palazzina B|A|B**	**482 g**	**gio 29/05/14**	**ven 01/04/16**
4	Realizzazione muro recinzione zona militare	55 g	gio 29/05/14	mer 13/08/14
5	Scavi	10 g	gio 29/05/14	mer 11/06/14
6	Fondazioni	35 g	gio 12/06/14	mer 30/07/14
7	1° Piano interrato - 1° solaio	60 g	gio 31/07/14	ven 31/10/14
8	Piano terra - 2° solaio	28 g	lun 03/11/14	mer 10/12/14
9	Primo piano - 3° solaio	28 g	gio 11/12/14	lun 09/02/15
10	Secondo piano - 4° solaio	28 g	mar 10/02/15	gio 19/03/15
11	Terzo piano - 5° solaio	28 g	ven 20/03/15	mar 28/04/15
12	Quarto piano - 6° solaio	28 g	mer 29/04/15	ven 05/06/15
13	Quinto piano - 7° solaio	28 g	lun 08/06/15	mer 15/07/15
14	Copertura in legno	28 g	gio 16/07/15	mar 01/09/15
15	Riempimenti, impermeabilizzazioni, drenaggi	20 g	lun 03/11/14	ven 28/11/14
16	Tamponamenti	60 g	lun 01/12/14	ven 19/06/15
17	Tramezze	50 g	mer 29/04/15	mar 07/07/15
18	Isolazioni e riempimenti per tetto verde	20 g	gio 16/07/15	mer 12/08/15
19	Lattonerie	25 g	gio 16/07/15	ven 28/08/15
20	Bancali e controtelai	23 g	lun 31/08/15	mer 30/09/15
21	Canne fumarie e areazione	24 g	lun 22/06/15	gio 23/07/15
22	Impianti elettrici, idraulici	80 g	lun 01/06/15	gio 01/10/15
23	Massetti e intonaci	60 g	lun 06/07/15	mar 06/10/15
24	Pavimenti freddi	50 g	lun 05/10/15	ven 11/12/15
25	Cassonetti	40 g	gio 01/10/15	mer 25/11/15
26	Serrammenti esterni	40 g	mer 07/10/15	mar 01/12/15
27	Tinteggiature	40 g	lun 18/01/16	ven 11/03/16
28	Pavimenti caldi	30 g	lun 14/12/15	ven 12/02/16
29	Opere di finitura impianti	35 g	lun 07/12/15	ven 12/02/16
30	Ascensori	75 g	lun 07/09/15	ven 18/12/15
31	Opere in ferro	18 g	mer 07/10/15	ven 30/10/15
32	Porte interne	26 g	lun 18/01/16	lun 22/02/16
33	Realizzazione muro di confine lotto alloggi	45 g	lun 14/09/15	ven 13/11/15
34	Allacciamenti sottoservizi	33 g	lun 24/08/15	mer 07/10/15
35	Sistemazioni esterne	50 g	gio 08/10/15	mar 29/12/15
36	Opere varie di finitura e collaudi	30 g	lun 22/02/16	ven 01/04/16
