

## OEG 4

## ATO 4

<p><b>Lieferung von geeignetem        Flockungshilfsmittel auf den 5        Abwasserreinigungsanlagen der ARA        Pustertal AG</b></p>	<p><b>Fornitura di flocculanti idonei per i 5        impianti di depurazione della società        ARA Pusteria SPA</b></p>
---	--

<p><b>ARA Innichen-Sexten        ARA Wasserfeld        ARA Tobl        ARA Sompunt        ARA Unteres Pustertal</b></p>	<p><b>IDA San Candido-Sesto        IDA Monguelfo        IDA Tobl        IDA Sompunt        IDA Bassa Val Pusteria</b></p>
---	---

<p><b>Terminplan        Cronoprogramma</b></p>
--

Datum: 28.02.2018
Änd./mod.
Änd./mod.
Beilage-Allegato
<b>SI</b>


 <small>ARA PUSTERTAL AG        ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL        Pflaurenz/Tobl 54 - 39030 ST. LORENZEN        Tel. 0474 479601 - Fax 0474 479641        MwSt. Nr.: 02524850417        St. Nr.: 02524850217</small> <p><b>ARA PUSTERTAL AG        ARA PUSTERIA SPA</b></p>
---

 <p><b>Projektsteuerer-Coordiatore di progetto        Dr. Ing. Konrad Engl</b></p>
---

<p>Dr. Ing. Konrad Engl        Abwassertechnik-Verfahrenstechnik        Pflaurenz-Tobl 54        I-39030 St. Lorenzen        Tel.: 0474/479601        Fax: 0474/479641        Email: <a href="mailto:KonradE@arapustertal.it">KonradE@arapustertal.it</a></p>
---



--



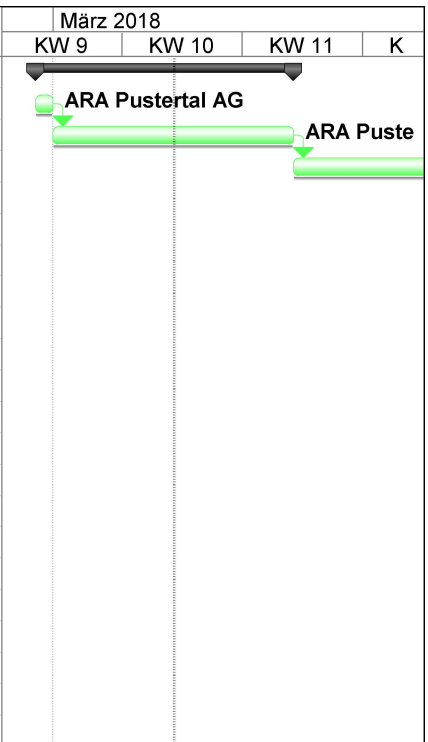



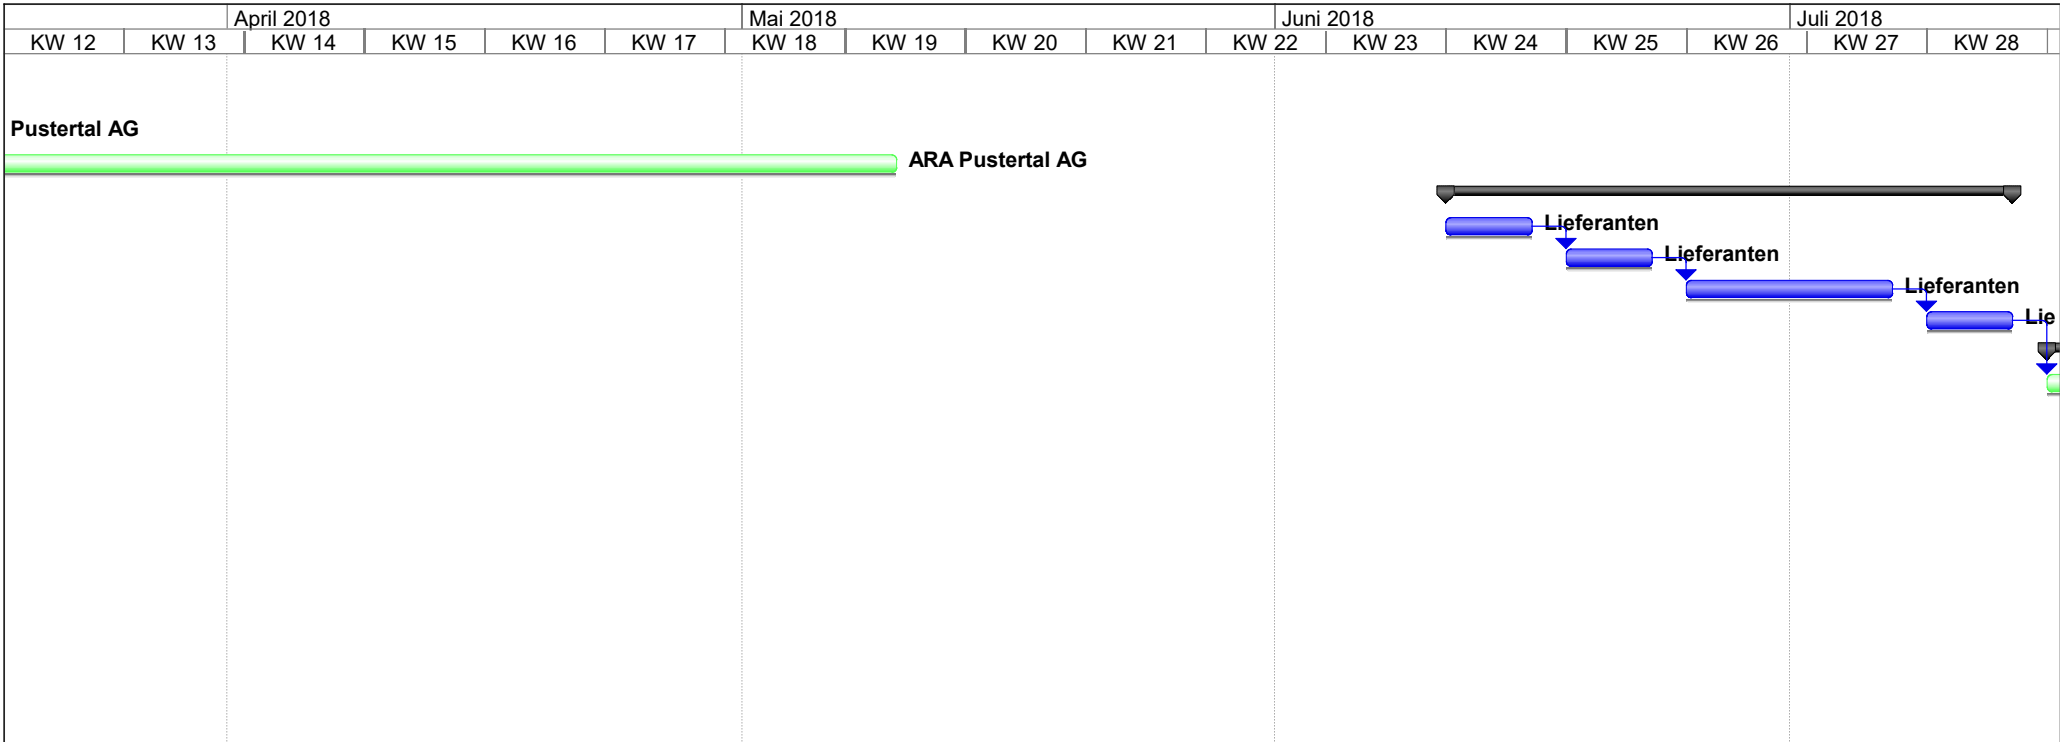


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	März 2018			
							KW 9	KW 10	KW 11	K
1	<b>Genehmigungsverfahren</b>	<b>11 Tage</b>	<b>Mi 28.02.18</b>	<b>Mi 14.03.18</b>						
2	Projektabgabe	1 Tag	Mi 28.02.18	Mi 28.02.18		ARA Pustertal AG				
3	VR ARA Pustertal	10 Tage	Do 01.03.18	Mi 14.03.18 2		ARA Pustertal AG				
4	Ausschreibung und Vergabe	40 Tage	Do 15.03.18	Mi 09.05.18 3		ARA Pustertal AG				
5	<b>Arbeitsvorbereitung</b>	<b>25 Tage</b>	<b>Mo 11.06.18</b>	<b>Fr 13.07.18</b>						
6	Abholen der Proben auf 5 Kläranlagen	5 Tage	Mo 11.06.18	Fr 15.06.18		Lieferanten				
7	Labortests	5 Tage	Mo 18.06.18	Fr 22.06.18 6		Lieferanten				
8	Ausfüllen und Abgabe Anlage 3	10 Tage	Mo 25.06.18	Fr 06.07.18 7		Lieferanten				
9	Lieferung 200 kg FHM für ARA Tobl	5 Tage	Mo 09.07.18	Fr 13.07.18 8		Lieferanten				
10	<b>Test in ARA Tobl</b>	<b>30 Tage</b>	<b>Mo 16.07.18</b>	<b>Fr 24.08.18</b>						
11	Test in ARA Tobl	20 Tage	Mo 16.07.18	Fr 10.08.18 9		ARA Pustertal AG				
12	Auswertung der Lieferanten Anlage 4a und Mitteilung der 3 Sieger	10 Tage	Mo 13.08.18	Fr 24.08.18 11		ARA Pustertal AG				
13	<b>Test Außenanlagen</b>	<b>10 Tage</b>	<b>Mo 27.08.18</b>	<b>Fr 07.09.18</b>						
14	Abgabe des Angebotes der 3 Siegerfirmen Anlage 5	5 Tage	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18 12		Lieferanten				
15	Lieferung 50 kg pro Anlage	5 Tage	Mo 27.08.18	Fr 31.08.18 14EA-5 Tage		Lieferanten				
16	Test auf Außenanlagen und Auswertung	5 Tage	Mo 03.09.18	Fr 07.09.18 15		ARA Pustertal AG				
17	<b>Weitere Vorgehensweise</b>	<b>39 Tage</b>	<b>Mo 10.09.18</b>	<b>Do 01.11.18</b>						
18	Öffnung der Angebote der 3 Sieger Anlage 5	1 Tag	Mo 10.09.18	Mo 10.09.18 16		ARA Pustertal AG				
19	Veröffentlichung des Siegers Anlage 4	4 Tage	Di 11.09.18	Fr 14.09.18 18		ARA Pustertal AG				
20	Stillhaltefrist	25 Tage	Mo 17.09.18	Fr 19.10.18 19		ARA Pustertal AG				
21	Vertragsunterzeichnung	1 Tag	Mo 22.10.18	Mo 22.10.18 20		ARA Pustertal AG				
22	Vertragsbeginn	1 Tag	Do 01.11.18	Do 01.11.18		ARA Pustertal AG				




Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Inni  
Datum: Do 08.03.18

Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	



Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Inni Datum: Do 08.03.18	Vorgang		Meilenstein		Externe Vorgänge	
	Unterbrechung		Sammelvorgang		Externer Meilenstein	
	In Arbeit		Projektsammelvorgang		Stichtag	

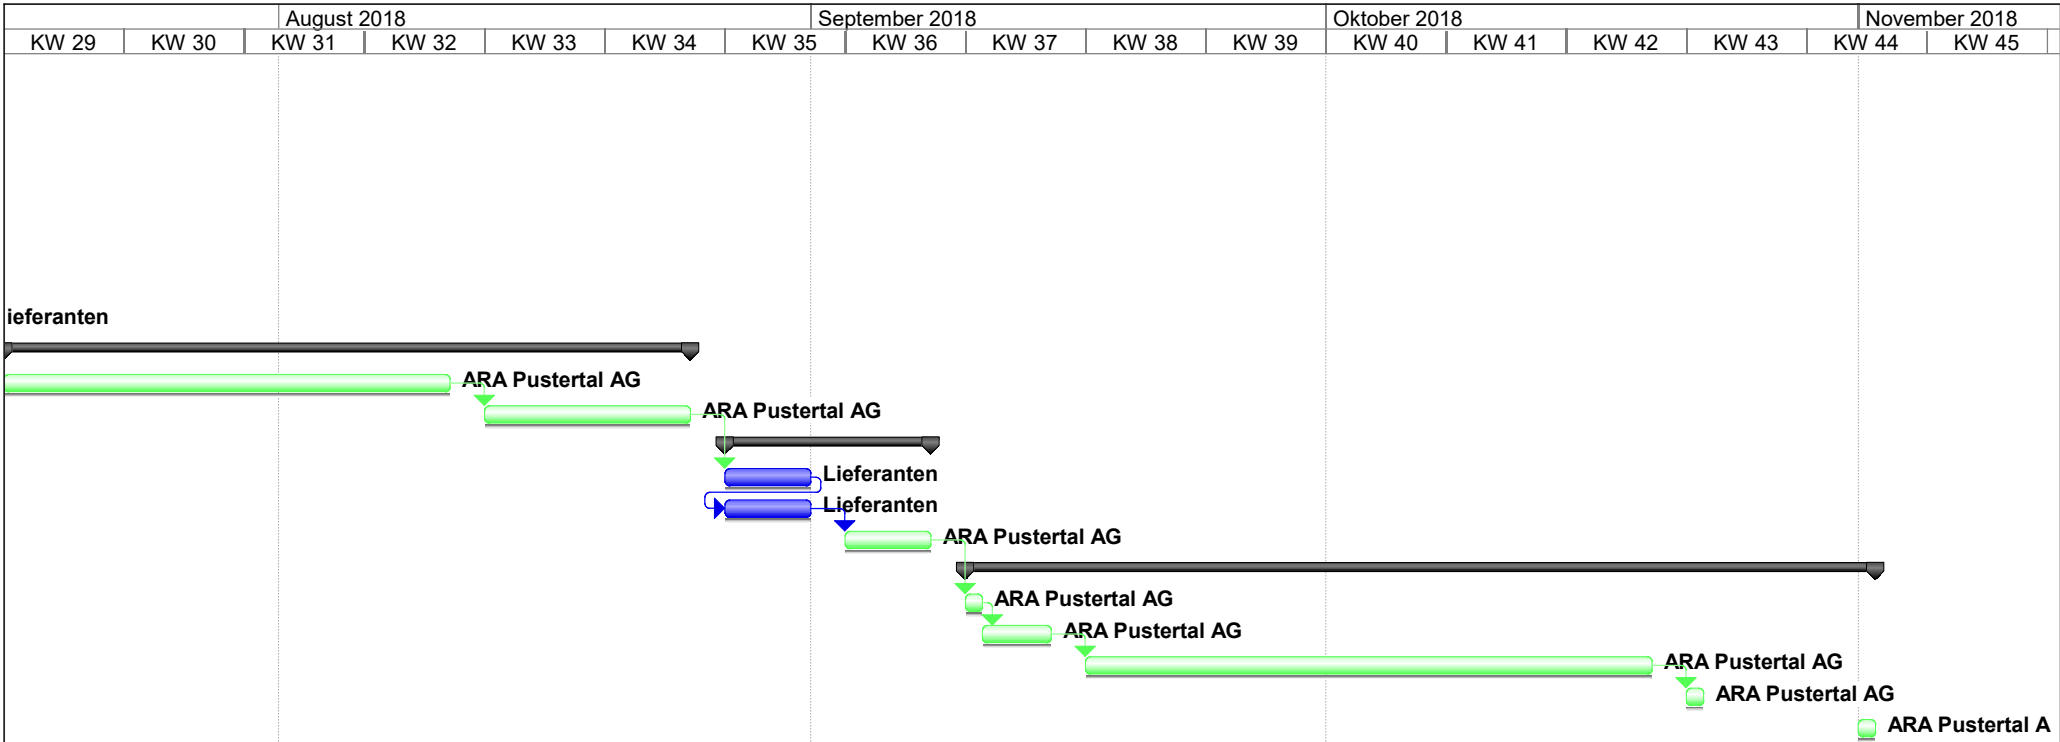

Projekt: Terminplan-Projekt-ARA Inni  
Datum: Do 08.03.18

- |               |  |                      |  |                      |  |
|---------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Vorgang       |  | Meilenstein          |  | Externe Vorgänge     |  |
| Unterbrechung |  | Sammelvorgang        |  | Externer Meilenstein |  |
| In Arbeit     |  | Projektsammelvorgang |  | Stichtag             |  |
